AREA GESTIONE EDILIZIA

SAPIENZA

UNIVERSITA' DI ROMA

Piazzale Aldo Moro n.5 - 00185 Roma

Progetto di completamento delle aree esterne dell' edificio "Marco Polo" (RM 021)

ELABORATI GENERALI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	**Ingegnere Gianluca Zori**
DIRETTORE DEI LAVORI	**Geometra Paolo Grottesi**
PROGETTAZIONE **TECHING SRL** Piazza Mancini 4, 00196 Roma Tel. 0636004762 - Fax 063213525 P.IVA e C.F. 05275071008 pec: amministrazione@pec.teching.it **www.teching.it** **Ing. Sergio Talia** **Ing. Davide Talia** TECHING architettura e ingegneria	TIMBRO

ELABORATO		SCALA:
CRO.	Cronoprogramma dei Lavori	-

ATTIVITA' DEL PROGETTISTA				APPROVAZIONE DEL COMMITTENTE	
DATA	REVISIONE	VERIFICA	ESECUTORE	DATA	FIRMA
08/08/2018	0	ST	FC/MC		

COMMESSA	DIRECTORY	SUB-DIRECTORY	FILE
CP 18 16 La Sapienza Marco Polo	Progetto Esecutivo	-	Cronoprogramma dei lavori

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	FASE 0 - ALLESTIMENTO CANTIERE	14 g	mer 02/01/19	lun 21/01/19
2	**FASE 1 e FASE 2 - parte coperta piano terra e parte scoperta primo piano**	**116 g**	**mer 09/01/19**	**mer 19/06/19**
3	sottofase 1 - OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE. Piano Terra	28 g	mer 09/01/19	ven 15/02/19
4	sottofase 2 - OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE. Piano Primo	28 g	mer 09/01/19	ven 15/02/19
5	sottofase 3 - IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. Piano Terra	30 g	mar 05/02/19	lun 18/03/19
6	sottofase 4 - IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. Piano Primo	30 g	mar 05/02/19	lun 18/03/19
7	sottofase 5 - OPERE MURARIE - Massetti e sottofondi. Tramezzature. Piano Terra	35 g	mer 27/02/19	mar 16/04/19
8	sottofase 6 - OPERE MURARIE - Massetti e sottofondi. Tramezzature. Piano Primo	35 g	mer 27/02/19	mar 16/04/19
9	sottofase 7 - OPERE MURARIE - Impermeabilizzazioni. Piano Terra	28 g	gio 21/03/19	lun 29/04/19
10	sottofase 8 - OPERE MURARIE - Impermeabilizzazioni. Piano Primo.	28 g	gio 21/03/19	lun 29/04/19
11	sottofase 9 - OPERE MURARIE E FINITURE - Pavimenti e rivestimenti. Piano Terra	22 g	ven 19/04/19	lun 20/05/19
12	sottofase 10 - OPERE MURARIE E FINITURE - Pavimenti e rivestimenti. Piano Primo	22 g	ven 19/04/19	lun 20/05/19
13	sottofase 11 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE. Piano Ter	20 g	lun 13/05/19	ven 07/06/19
14	sottofase 12 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE. Piano Pri	20 g	lun 13/05/19	ven 07/06/19
15	sottofase 13 - OPERE MURARIE - Montaggio Infissi. Piano Terra	13 g	lun 03/06/19	mer 19/06/19
16	sottofase 14- OPERE MURARIE - Finiture e Intonacature. Piano Terra	12 g	lun 03/06/19	mar 18/06/19
17	FASE 3 e FASE 4 - Completamento parte esterna e arredo urbano (recinzioni, soglie,aiuole). Piano Terra e Piano Primo	36 g	mar 18/06/19	mar 06/08/19
18	FASE 5 - Smobilizzo del cantiere	18 g	mer 07/08/19	ven 30/08/19

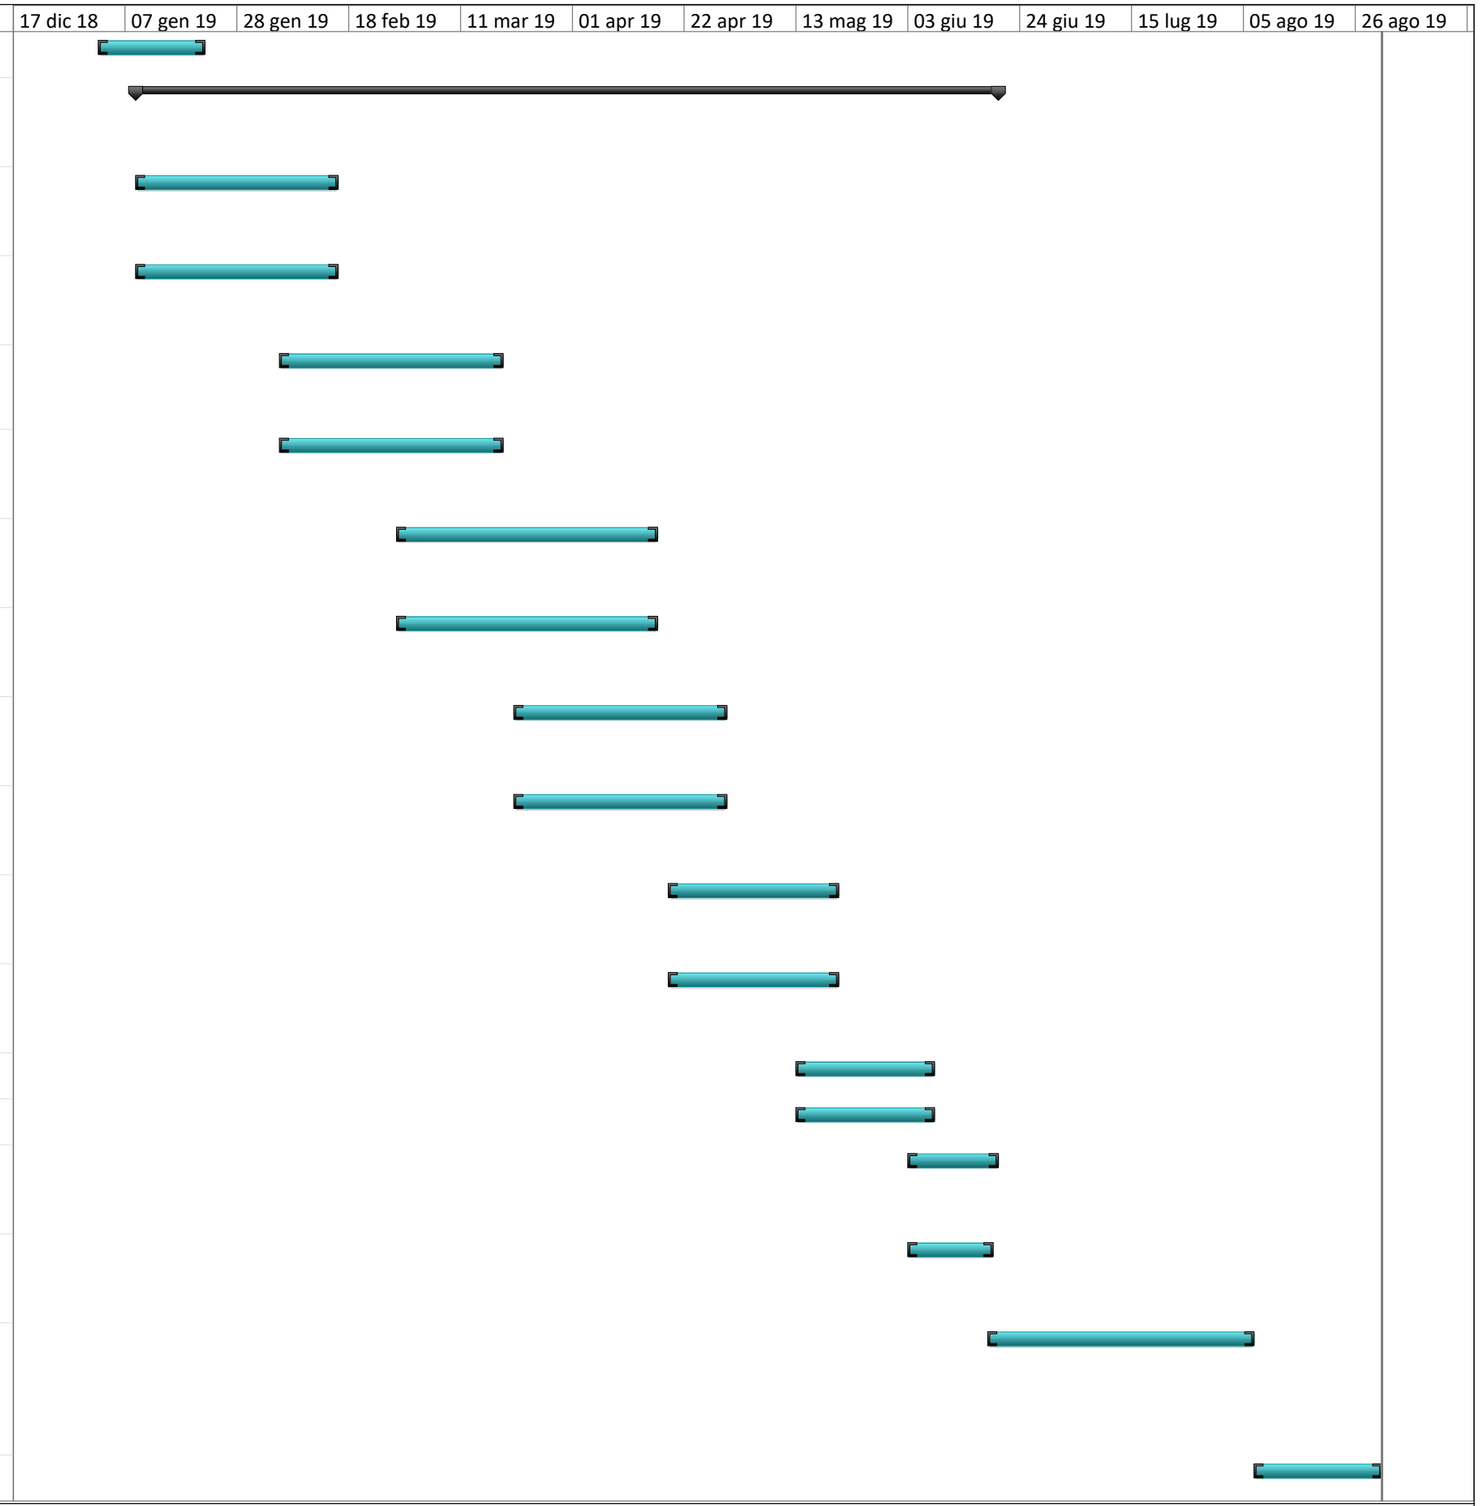

Progetto: Cronoprogramma rev.3
Data: mar 18/09/18

Attività		Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Scadenza	
Divisione		Attività esterne		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Avanzamento	
Cardine		Cardine esterno		Attività manuale		Solo inizio			
Riepilogo		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine			
